CRONOGRAMA MACRO/HISTOGRAMA - UAS PARADA 2018

Risoterm
Isolantes Térmicos Ltda

CRONOGRAMA DE MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Dur.	Inicio	Term.
1	**Reforma do Camara de Combustão do Secador**	15 d	19/03/2018 08:00	04/04/2018 08:00
2	Planejamento	45 d	05/02/2018 08:00	18/03/2018 08:00
3	Mobilização/Preparativos	5 d	12/03/2018 08:00	16/03/2018 00:00
4	Caldeiraria	1 d	19/03/2018 08:00	19/03/2018 12:00
5	Demolição	2 d	19/03/2018 13:00	20/03/2018 08:00
6	Caldeiraria	1 d	21/03/2018 08:00	21/03/2018 12:00
7	Montagem	11 d	21/03/2018 00:00	01/04/2018 00:00
8	Desmobilização	3 d	02/04/2018 10:00	04/04/2018 10:00

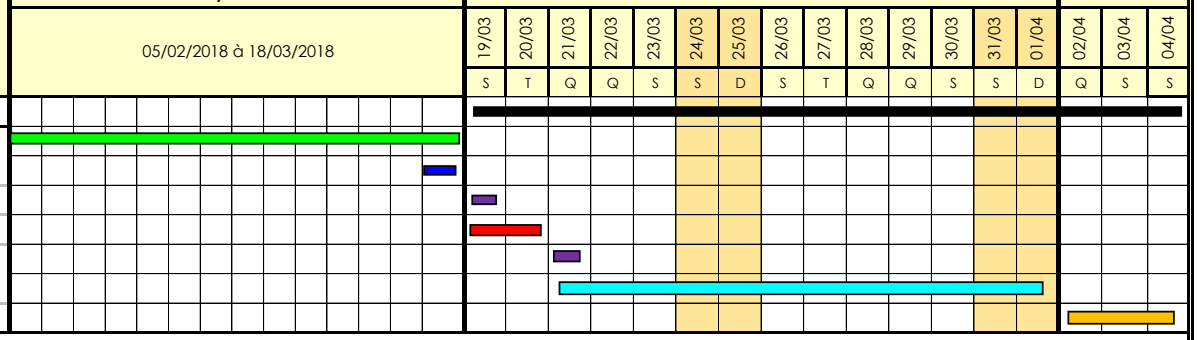

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

	PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO														PARADA DO FORNO REFINO UAS														DESMOB.		
Mão de Obra Indireta																															
COORDENADOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEC. PLANEJ.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEC. SEG															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mão de Obra Direta	**PRÉ PARADA /PLANEJAMENTO**														**PARADA DO FORNO UAS**														**DESMOB.**		
ENCARREGADO REFRATÁRIO														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEDREIRO REFRATARISTA														8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8		
CORTADOR															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
AJUDANTE														12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	6	4
OBS. SEGURANÇA															3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	5	5			
Totais																															
TOTAL HOMENS EQUIPE INDIRETA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL HOMENS EQUIPE DIRETA														9	12	27	27	27	27	27	29	27	27	27	27	27	29	29	15	7	5
TOTAL HOMENS GERAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11	14	29	29	29	29	29	31	29	29	29	29	29	31	31	17	9	7
